



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
AUTORITATEA DE MANAGEMENT
pentru POS TRANSPORT



DIRECȚIA GENERALĂ RELAȚII FINANCIARE EXTERNE
DIRECȚIA PROGRAMARE

INSTRUCȚIUNEA NR.2
PLANUL DE ACHIZIȚII

Pași îndrumători în analiza planului de achiziții depuse la AM finanțare:

1. Se va verifica dacă Planul de Achiziții cuprinde toate contractele aferente proiectului indiferent de procedura de atribuire (inclusiv achiziție directă). Planul de achiziții se verifică dacă are cuprinse toate contractele dacă se verifică egalitatea între valoarea totală a planului de achiziții și valoarea totală din planul financiar minus categoriile de cheltuieli pentru care nu se pot încheia contracte ca urmare a lansării unei proceduri de atribuire (de ex. stimulare financiară) → **DA**


2. Se va verifica ca obiectul contractelor din Planul de Achiziții să fie cât mai clar definit și acolo unde contractele sunt semnate să se treacă titlul contractului, numărul și data semnării. → **DA**

3. Se va urmări ca în cazul în care la contractele semnate există acte adiționale, acestea din urmă să fie trecute la poziții separate cu menționarea valorii semnate, procedura de negociere derulată și data semnării → **DA**

4. Se va urmări ca la coloana "valoarea estimată", sumele trecute să fie în lei și în EUR fără TVA. De asemenea se va urmări ca :
 - pentru contractele semnate să fie trecută valoarea în lei și EUR fără TVA din contract/act adițional (curs echivalent la data semnării contractului/actului adițional);
 - pentru contractele ale căror proceduri de atribuire sunt în derulare se va trece valoarea estimată în lei și EUR din devizul general (inclusiv diverse și neprevăzute) → **DA**

5. Se va urmări ca la coloana "procedura aplicată" să fie trecută procedura real aplicată sau care se va aplica.
 - Pentru contractele încheiate se vor verifica datele din anunțurile de atribuire;
 - pentru achiziție directă se va verifica ca suma să fie sub pragul din O.G34/2006 cu modificările și completările ulterioare. → **DA**

6. Pentru coloanele de date estimate se va verifica valabilitatea lor cu anunțurile de atribuire pentru contractele semnate. Pentru contractele viitoare se vor verifica corelările cu calendarul de implementare. De asemenea acum se va verifica și corespondența (preluarea) corectă cu Calendarul de Implementare. → **DA**

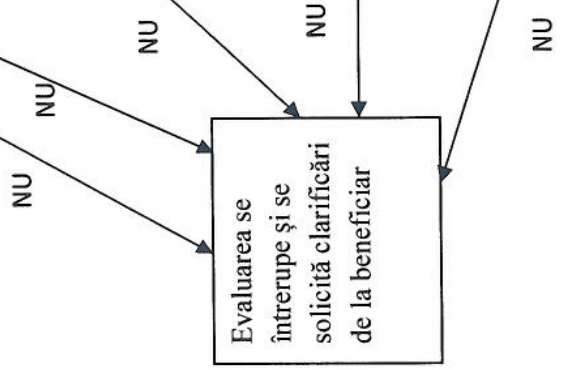

Plan de Achiziții OK
